



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Conferința de presă privind implementarea proiectului Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt, în perioada 2014-2020"-Etapa II, Cod SMIS: 2021+ 318301

Proiect etapizat cofinanțat prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027

27 ianuarie 2025



Proiect cofinanțat până la 28.05.2024 prin
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

cod SMIS **2014+ 133612**



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Subiecte abordate

- Scurtă prezentare a proiectului regional "*Dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata din județul Olt in perioada 2014-2020*"
- Trecerea de la Programul Operațional Infrastructura Mare 2014 - 2020 la Programul Dezvoltare Durabilă 2021 – 2027 pentru proiectul regional "*Dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata din județul Olt in perioada 2014-2020*"
- Prezentarea progresului proiectului
- Provocări



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Intro-speech

"Acest proiect este unul dintre cele mai importante pentru comunitatea din Olt. Anvergura obiectivului este pe măsura amplitudinii impactului asupra calității vieții oamenilor. Apa înseamnă viață: așadar investițiile pe care le facem în sistemele de apă și apă uzată vor crește calitatea vieții.

Protejarea apei și asigurarea stării ei ecologice reprezintă unul dintre pilonii politicii de mediu a UE, iar aceste investiții în infrastructura de apă urmăresc dezvoltarea unor sisteme cu influență directă asupra sănătății populației, asigurarea siguranței în exploatare, eliminarea deficiențelor actuale, funcționarea sistemelor cu costuri de exploatare minime și posibilitatea extinderii acestora pe viitor.

Reducerea poluării râurilor prin epurarea apelor uzate înainte de deversare va stimula dezvoltarea biodiversității, a activităților de agrement, a agriculturii și dezvoltarea industrială și comercială din Aria de investiții."



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Scurtă prezentare a proiectului



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Proiect cofinanțat până la 28.05.2024 prin
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020
cod SMIS **2014+ 133612**



Obiective. Rezultate așteptate

Obiectiv: continuarea dezvoltării infrastructurii de apă și apă uzată prin creșterea gradului de colectare și tratare a apelor uzate, respectiv prin creșterea gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației în **25 de UAT uri de pe raza județului.**

Rezultatele așteptate

Infrastructura de apă - extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă	Infrastructura de apă uzată - vizează îmbunătățirea colectării și tratării apei uzate după cum urmează
• 73.410 persoane vor beneficia de o mai bună alimentare cu apă • Realizarea a 238,94 km conducte noi sau optimizate; • Realizarea a 7 stații de tratare noi, • Reabilitarea a 4 stații de tratare; • Realizarea a 11 stații de pompare noi; • Reabilitarea a 6 stații de pompare; • Investiții privind 12 rezervoare înmagazinare; • Realizarea a 20 puțuri forate noi și reabilitarea a 69 puțuri forate;	• 77.056 persoane vor beneficia de un serviciu mai bun de gestionare a apelor uzate, • Realizarea a 231,66 km conducte noi sau optimizate; • Construcția a 140 stații pompare apă uzată noi; • Reabilitarea a 10 stații pompare apă uzată; • Extinderea facilitatilor de depozitare nămol tratat și reabilitarea infrastructurii de transfer apă uzată către SEAU Slatina



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Aria de investiții

Pentru alimentarea cu apă potabilă 25 de UAT-uri :

- 8 U.A.T.-uri preluate de Operatorul Regional : Slatina, Caracal, Bals, Corabia, Draganesti-Olt, Scornicesti, Potcoava, Piatra-Olt
- 17 U.A.T-uri ce vor fi preluate, la finalizarea investitiilor: Daneasa, Ganeasa, Gostavatu, Babiciu, Scarisoara, Dobrosloveni, Farcasele, Izbiceni, Giuvarasti, Tia-Mare, Rusanesti, Serbanesti, Crimpoia, Visina, Balteni, Perieti, Schitu

Pentru infrastructura de apă uzată:

- 16 aglomerări: Slatina, Caracal, Corabia, Bals, Draganesti Olt, Piatra Olt–Ganeasa, Scornicesti, Potcoava, Gostavatu-Babiciu-Scarisoara, Balteni-Perieti-Schitu, Farcasele, Serbanesti, Crampoia, Visina, Rusanesti, Tia Mare





Cofinanțat de
Uniunea Europeană



**26 Contracte de
lucrări**

**7 Contracte de
furnizare**

**Proiect regional
POIM - PDD**

**4 Contracte de
servicii**



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Trecerea de la POIM 2014-2020 la PDD 2021-2027



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Proiect cofinanțat până la 28.05.2024 prin
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020
cod SMIS **2014+ 133612**



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Cofinanțarea prin POIM 2014 - 2020

Compania de Apă Olt a semnat în data de 19.11.2019:

Contractul de Finanțare pentru proiectul "Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt în perioada 2014-2020" finanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020

Valoarea contractului la 31 decembrie 2023 – finalizare POIM: 453.540.965,31 lei, din care:

- Valoarea totală eligibilă: 382.167.901,21 lei
 - Contribuția nerambursabilă a Uniunii Europene: 305.352.153,07 lei
 - Contribuția bugetului de stat: 46.700.917,53 lei
 - Contribuția bugetului local: 7.184.756,54 lei
 - Contribuția beneficiarului – Compania de Apă Olt: 22.930.074,07 lei.



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Trecerea de la POIM la PDD

- În 2019 a fost semnat între Ministerul Fondurilor Europene și CAO contractul de finanțare nr. 279/19.11.2019 pentru finanțarea proiectului regional *"Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt în perioada 2014-2020"* (SMIS 2014 + 133612)
- În mai 2024 a fost emisă de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Decizia de aprobare preliminară a finanțării proiectului regional *"Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt în perioada 2014-2020"* - etapa II (SMIS 2021+ 318301)
- Ca urmare a analizelor realizate în procesul de etapizare, o parte din valoarea proiectului declarată anterior neeligibilă (lucrările aferente CL 07 – *Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și apă uzată în aglomerarea Corabia*) a fost acceptată ca fiind eligibilă la finanțare prin PDD 2021 – 2027, respectiv reducerea efortului de finanțare de la nivelul Companiei de Apă Olt.

Euro	Total proiect conform aprobării inițiale prin Decizie CE 2019 (euro)			Faza 1 (POIM)			Faza II (PDD)		
	(euro)			(euro)			(euro)		
	Costurile totale	Costuri neeligibile	Costurile eligibile	Costurile totale	Costuri neeligibile	Costuri eligibile	Costurile totale	Costuri neeligibile	Costuri eligibile
	(A)=(B)+(C)	(B)	(C)	(A)=(B)+(C)	(B)	(C)	(A)=(B)+(C)	(B)	(C)
Subtotal	241,491,806.00	21,296,521.00	220,195,285.00	80,316,058.30	0.00	80,316,058.30	161,175,747.70	414,821.00	160,760,926.70
(TVA)	44,236,903.00	44,236,903.00	0.00	14,999,698.48	14,999,698.48	0.00	29,237,204.52	29,237,204.52	0.00
TOTAL	285,728,709.00	65,533,424.00	220,195,285.00	95,315,756.77	14,999,698.48	80,316,058.30	190,412,952.22	29,652,025.52	160,760,926.70



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Sinteza indicatorilor POIM - PDD

Denumire indicator	Unitate măsură	Valoare țintă la nivelul întregului Proiect	Valoare realizată POIM	Valoare de realizat PDD
2S77 - Rezervoare înmagazinare	bucăți	15.00	3.00	12.00
2S78 - Stații tratare apă	bucăți	14.00	3.00	11.00
2S70 - Rețea de distribuție apă potabilă (nouă)	km	220.72	93.30	127.42
2S71 - Rețea de distribuție apă potabilă (reabilitată)	km	96.58	18.00	78.58
2S72 - Aducțiuni (nouă)	km	10.46	5.43	5.03
2S73 - Aducțiuni (reabilitare)	km	53.25	25.34	27.91
2S74 - Rețea canalizare (nouă)	km	323.49	125.99	197.50
2S75 - Rețea canalizare (reabilitată)	km	37.87	3.71	34.16
2S80 - Stații epurare ape uzate care deserveșc aglomerări sub 10.000 l.e.	bucăți	7.00	0.00	7.00
2S79 - Stații de epurare ape uzate care deserveșc aglomerări cu peste 10.000 l.e.	bucăți	3.00	0.00	3.00
Reabilirae foraje	buc	79	10	69
Execuție foraje noi	buc	30	10	20
Construcții stații de pompare apă potabilă	buc	13	2	11
Reabilitare stații pompare apă potabilă	buc	6	0	6
Construcții stații pompare apă uzată	buc	156	16	140
Reabilitare stații pompare apă uzată	buc	10	0	10
SEAU-Slatina - Extinderea facilităților de depozitare nămol tratat și reabilitare infrastructura transfer apă uzată către SEAU	buc	1	0	1
Sistem SCADA	buc	1	0	1



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Cofinanțarea prin PDD 2021-2027

Compania de Apă Olt a semnat în data de 28.05.2024:

Contractul de Finanțare pentru proiectul "Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt în perioada 2014-2020" etapa II finanțat în cadrul Programului Dezvoltare Durabilă 2021 – 2027

Valoarea contractului de finanțare: 906.041.950,72 lei, din care:

- Valoarea totală eligibilă: 764.948.716,52 lei.
 - Contribuția nerambursabilă a Uniunii Europene: 611.194.024,50 lei
 - Contribuția bugetului de stat: 93.476.733,17 lei
 - Contribuția bugetului local: 14.381.035,86 lei
 - Contribuția beneficiarului – Compania de Apă Olt: 45.896.922,99 lei.

Durata contractului de finanțare este de 36 luni, respectiv perioada cuprinsă între 01.01.2024 și 31.12.2026.



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Progresul proiectului
Progres fizic general: 64,22 %
Progres financiar total: 43 %



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Proiect cofinanțat până la 28.05.2024 prin
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020
cod SMIS **2014+ 133612**



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Progresul proiectului (I)

4 contracte de servicii:

- **CS 1-** Asistenta tehnica pentru managementul proiectului (semnat în 29.04.2020 – în derulare)
- **CS 3-** Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor (semnat în 08.09.2020 – în derulare)
- **CS 2.1 -** Dezvoltarea GIS la nivelul noului sistem zonal de alimentare cu apa(licente dezvoltare harti de baza, inclusiv echipamente IT) – semnat în 14.09.2022 - în derulare
- **CS 2.2 -** Dezvoltarea GIS la nivelul noului sistem zonal de alimentare cu apa, lucrări integrate **SCADA** sistem apa de la noile sisteme de alimentare cu apa în Dispeceratul zonal CAO – semnat în 29.11.2022 - în derulare
- **CS 4 -**Servicii de audit al proiectului – semnat în 30.01.2023 – în derulare

1 contract furnizare nr. 11645/05.05.2021 - Furnizare Echipamente si utilaje în cadrul proiectului regional:

- Autolaborator dotat cu echipament specializat inspectie video Bals
- Excavator prin aspirare
- Autocombinata (7 mc)
- Buldoexcavator CX4
- Autobasculanta transport namol si pamant
- Echipament denisipare foraje (compresoare pompe mamut)
- Incarcator frontal 4buc(Slatina, Caracal, Bals, Corabia) – contract finalizat







Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Progresul proiectului (II)

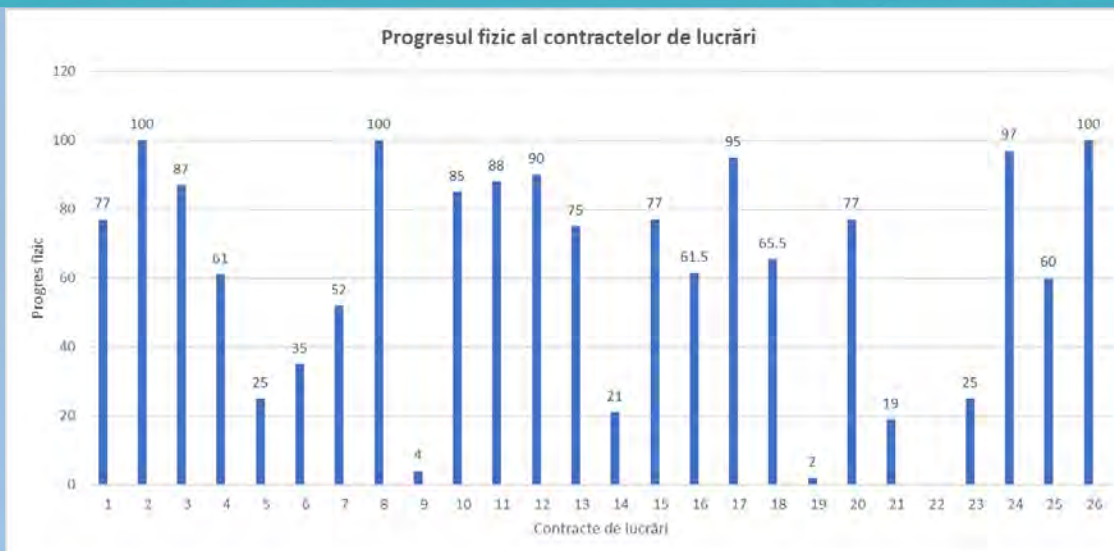


Progres fizic (%)



■ Realizat ■ Rămas

Progres financiar (%)



■ Realizat ■ Rămas



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Progresul proiectului (III)

CL 01 - Extinderea si reabilitarea rețelelor de alimentare cu apa si apa uzata, inclusiv surse de apa existente, in aglomerarea Slatina - contract nr. 17171/16.10.2020

- Progres fizic: 77,00%
- Progres financiar: 84,20%

CL 02Y – Extindere facilitate de depozitare namol tratat si reabilitare infrastructura transfer apa uzata catre SEAU Slatina – contract nr. 15992/02.10.2020.

- Progres fizic: 100,00%
- Progres financiar: 94,37%

CL 3 - Reabilitare sistem de tratare apa in aglomerarea Caracal - contract nr. 18293/08.07.2021

- Progres fizic: 87,00%
- Progres financiar: 92,94%





Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Progresul proiectului (IV)

CL 04 - Extinderea si reabilitarea rețelelor de alimentare cu apa si apa uzata inclusiv surse de apa existente in aglomerarea Caracal - contract nr. 255/10.01.2022

- Progres fizic : 61,00 %
- Progres financiar: 40,97 %

CL 5 - Extinderea facilitatilor de tratare apa uzata in aglomerarea Caracal - contract nr. 24183/09.09.2021

- Progres fizic: 25,00 %
- Progres finanaciari: 6,87%

CL 06 - Imbunatatirea facilitatilor de tratare apa potabila pentru aglomerarea Corabia - contract nr. 32922/23.12.2021

- Progres fizic: 35,00 %
- Progres finanaciari: 15,19 %



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Progresul proiectului (V)

CL07R - Extinderea si reabilitarea rețelelor de alimentare cu apa si apa uzata in aglomerarea Corabia–contract semnat nr.18468/09.07.2021. (REZILIAT- incepand cu data de 15.07.2024 se afla in procedura de inventariere, in vederea stabilirii stadiul fizic si financiar existent la data rezilierii, astfel incat sa poata fi deschisă procedura de atribuire)

- Progres fizic: 52,00 %
- Progres financiar : 26,66 %

CL 08 - Extindere retea de canalizare in aglomerarea Visina, contract nr. 8586/02.06.2020

- Progres fizic : 100%
- Progres financiar : 97,87%

CL 09Y - Extinderea si reabilitarea facilitatilor de tratare a apei uzate pentru aglomerarile Corabia si Visina – contract nr. 9105/28.04.2022

- Progres fizic: 4,00%
- Progres financiar: 1,58 %



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Progresul proiectului (VI)

CL10R - Imbunatatirea facilitatilor de tratare apa potabila si extinderea retelelor de apa si canalizare in aglomerarea Potcoava – contract nr.6015/11.03.2021.

- Progres fizic: 85,00%
- Progres financiar: 50,55 %

CL 11R-Imbunatatirea facilitatilor de tratare apa potabila si extinderea retelelor de apa si canalizare in aglomerarea Scornicesti – contract nr. 1826/22.01.2021

- Progres fizic: 88,00%
- Progres financiar: 76,73%

CL 12-Reabilitarea facilitatilor captare, tratare si inmagazinare apa potabila in aglomerarea Bals – contract nr. 15919/11.06.2021

- Progres fizic: 90,00%
- Progres financiar: 110,67%



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Progresul proiectului (VII)

CL13R - Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și apă uzată în aglomerările Rusanesti și Tia Mare-Izbiceni-Giuvarasti – contract nr.5212/26.02.2021.

- Progres fizic : 75,00%
- Progres financiar: 37,54%

CL 14 - Extinderea facilitatilor de tratare a apei uzate pentru glomerările Tia Mare și Rusanesti -contract nr. 17683/11.10.2022.

- Progres fizic: 21,00 %
- Progres financiar: 7,71 %

CL 15 - Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și apă uzată, în aglomerările Farcasele-Dobrosloveni, Balteni-Perieti- Schitu și Gostavatu-Babiciu-Scarisoara - contract nr. 20980/07.12.2020

- Progres fizic: 77,00%
- Progres financiar: 68,79%



Progresul proiectului (VIII)

CL 16 - Extinderea rețelelor de apa si apa uzata pentru aglomerarea Draganesti-Daneasa, contract nr.15745/29.09.2020

- Progres fizic: 61,50%
- Progres financiar: 33,07%

CL 17 - Extinderea rețelelor de apa uzata pentru aglomerarea Piatra-Olt - Ganeasa, contract nr. 7597/06.05.2020.

- Progres fizic: 95,00%
- Progres financiar: 60,07%

CL 18 - Extinderea rețelelor de apa uzata in aglomerarea Serbanesti-Crampoia - contract nr.15402/25.09.2020.

- Progres fizic: 65,50%
- Progres financiar: 49,72 %



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Progresul proiectului (IX)

CL 19 - Extinderea facilitatilor de tratare a apei uzate pentru aglomerarile Serbanesti - Crampoia si Balteni – Perieti - Schitu - contract nr.13611/04.09.2023

- Progres fizic: 2,00%
- Progres financiar : 0,00%

CL 20 - Extinderea si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si apa uzata in aglomerarea Bals – contract nr. 11983 /07.05.2021.

- Progres fizic: 77,00%
- Progres financiar: 54,96%

CL 21 - Extinderea facilitatilor de tratare a apei uzate pentru aglomerarea Bals - contract nr. 9567/05.05.2022.

- Progres fizic: 19,00 %
- Progres financiar: 14,51 %



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Progresul proiectului (X)

CL 22 - Extinderea facilitatilor de tratare a apei uzate pentru aglomerarile Dobrosloveni - Farcasele si Gostavatu – Babiciu - Scarisoara - Procedura a fost relansată a cincea oară în 04.01.2024, procedura a fost contestată și anulată (procedura a fost lansata prima data in mai 2021 si apoi de inca patru ori

Valoare estimata : 17.615.760,04 lei

Investitii lucrari propuse :

- Statie de epurare Farcasele - 1buc
- Statia de epurare Scarisoara - 1buc

CL 23Y - Extinderea facilitatilor de captare si tratare apa potabila in aglomerarile Babicie-Scarisoara-Gostavatu si Farcasele –Dobrosloveni – contract nr. 20779/06.12.2022

- Progres fizic: 25,00%
- Progres financiar: 10,51 %

CL 24 - Extinderea facilitatilor de captare si tratare apa potabila in aglomerarile Giuvaresti - Izbiceni si Rusanesti – contract nr.30793/23.11.2021 ;

- Progres fizic: 97,00 %
- Progres financiar: 126,09 %



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Progresul proiectului (XI)

CL 25 - Extinderea facilitatilor de captare, inmagazinare si tratare apa potabila in aglomerarea Balteni – Perieti - Schitu – contract nr. 18746/13.07.2021

- Progres fizic: 60,00 %
- Progres financiar: 36,25 %

CL 26Y - Echiparea statiilor de tratare apa potabila ale Municipiului Slatina cu filtre pentru potabilizarea apei – contract nr.10718/21.04.2021.

- Progres fizic: 100,00%
- Progres financiar: 96,43%





Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Rezultate așteptate ale realizării proiectului

- Creșterea calității serviciilor publice de apă și canalizare, fiind asigurată alimentarea continuă cu apă potabilă de calitate a localităților incluse în Proiect;
- Reducerea pierderilor de apă, reflectată în consumul facturat;
- Efect benefic imediat asupra mediului prin eliminarea contaminării din apa freatică și din subsol, datorită reducerii semnificative a masei de poluanți nutritivi și organici deversată direct în cursurile de apă locale;
- Reducerea costurilor de operare necesare tratării apei, pentru potabilizare, prin diminuarea costurilor reactivilor și prin micșorarea costurilor întreținerii utilajelor și instalațiilor;
- Creșterea eficienței energetice conducând la scăderea consumului de energie, toate acestea având drept rezultat reducerea, în timp, a facturii pentru apa potabilă furnizată către populație;
- Oportunități de dezvoltare a localităților județului în care sunt realizate investiții.



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Provocări



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Proiect cofinanțat până la 28.05.2024 prin
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020
cod SMIS **2014+ 133612**



Provocări

- Finalizarea tuturor investițiilor în termenele propuse la semnarea proiectului pentru etapa II în PDD. În acest sens:
 - Monitorizare mai strictă a derulării contractelor;
 - Dialog permanent cu supervisorul cu privire la eventuale blocaje și propuneri pentru rezolvare;
 - Asigurare flux rambursări pentru a avea resurse financiare pentru plata antreprenorilor și consultanților
- Menținerea tarifelor pentru consumatori
 - Preocuparea menținerii tarifelor în limita ratei de suportabilitate
 - Efectele directe ale investițiilor: creșterea calității serviciilor de furnizare apă potabilă și colectare ape uzate în localitățile în care aceste servicii existau și extinderea la alte localități din județ
 - Creșterea calității mediului
 - Creșterea eficienței energetice, respectiv scăderea consumului de energie cu efect asupra prețului de facturare
 - Conștientizarea populației cu privire la un consum corelat cu nevoile, utilizare sustenabilă a resursei de apă



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Concluzii

Proiectul regional își propune îmbunătățirea standardului de viață al cetățenilor și asigurarea accesului acestora la infrastructura de apă și apă uzată, în județul Olt, prin oferirea către populație a unor servicii de utilități corespunzătoare, la calitatea cerută

- Prin implementarea Proiectului regional va crește calitatea serviciilor publice de apă și canalizare, fiind asigurată alimentarea continuă cu apă potabilă de calitate a localităților incluse în Proiect;
- Prin implementarea Proiectului regional pierderile în rețeaua de apă uzată vor fi reduse, având un efect benefic imediat asupra mediului prin eliminarea contaminării din apa freatică și din subsol, datorită reducerii semnificative a masei de poluanți nutritivi și organici deversată direct în cursurile de apă locale;
- Vor fi micșorate de asemenea pierderile în rețeaua de apă potabilă, fiind astfel îmbunătățit serviciul de furnizare a apei potabile din punct de vedere al continuității și calității;
- Prin implementarea Proiectului regional se vor reduce costurile de operare necesare tratării apei, pentru potabilizare, prin diminuarea costurilor reactivilor și prin micșorarea costurilor întreținerii utilajelor și instalațiilor; de asemenea investițiile realizate vor crește eficiența energetică conducând la scăderea consumului de energie, toate acestea având drept rezultat reducerea, în timp, a facturii pentru apa potabilă furnizată către populație;
- Se vor menține locurile de muncă existente, cu crearea de locuri de muncă în etapa de implementare a Proiectului regional și cu posibilitatea unor noi angajări pe perioada exploatării și întreținerii;
- Datorită efectelor benefice asupra mediului înconjurător, de refacere a ecosistemelor acvatice și nu numai, finalizarea implementării Proiectului regional poate genera oportunități de dezvoltare a oricărei zonă din județ;
- Odată cu finalizarea implementării Proiectului regional locuitorii județului Olt vor utiliza sustenabil resursele primare de apă!



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Întrebări?





Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Mulțumim !



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Proiect finanțat până la 28.05.2024 prin
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020
cod SMIS 2014+ 133612
